

ACTA FORMAL DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL INCREMENTO

CIERRE FORMAL DE SPRINT 1: TIENDA PÚBLICA ONLINE — TODOFREAK STORE

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT Y DEL PROYECTO

Proyecto / Sistema	TodoFreak Store — Plataforma Web de E-commerce y Gestión
Sprint Evaluado	Sprint 1 — Tienda Pública Online (Catálogo, Home, Legales, Redes)
Período de Ejecución	31 de agosto de 2026 al 14 de septiembre de 2026
Entorno y Despliegue	https://staging.todofreak.cl/ · Rama base: develop (commit 131e31b)
Product Owner (Cliente)	César Quintana Trujillo (Dueño y Representante TodoFreak Store)
Scrum Master	Gustavo Góngora
Equipo de Desarrollo	Martín Jara (Full Stack) y Miguel Astorga (Frontend / UX)

2. OBJETIVO DEL SPRINT, DEMOSTRACIÓN Y VALIDACIÓN EN NAVEGADOR

El objetivo del Sprint 1 fue disponibilizar en internet la tienda pública de TodoFreak Store en staging (<https://staging.todofreak.cl/>), permitiendo al cliente exhibir productos con catálogo navegable, buscador, filtros, ficha detallada, landing Home, página institucional 'Sobre nosotros', pie de página legal y botón flotante de WhatsApp.

En la sesión de demostración presencial, César validó y aceptó el incremento observando directamente la interacción en el navegador web. Un conjunto de 27 pruebas clave fue demostrado y verificado in situ frente al cliente, enfocado primordialmente en: la interacción real de filtros y búsqueda (HU-02 completa con sus 6 escenarios), la adaptabilidad responsive y visualización en pantallas móviles estrechas (360px), el comportamiento visual de productos agotados / sin stock, la sección de productos más vendidos según ventas reales registradas y el flujo de edición básica desde el panel de administración. César manifestó su plena conformidad técnica con estos comportamientos en vivo.

3. EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INCREMENTO ENTREGADO

ID HU / TFS	Funcionalidad / Módulo	Demo Navegador	Pruebas QA	Evidencia Git / Trazabilidad	Dictamen PO
HU-01 / TFS-009	Catálogo visual de productos	Conforme	5/6 Aprobadas	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada c/ Reparos
HU-02 / TFS-010	Categorización y filtros	Conforme (27 pruebas)	6/6 Aprobadas (100%)	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada Conforme
HU-03 / TFS-011	Ficha de producto	Conforme (27 pruebas)	5/5 Aprobadas (100%)	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada Conforme
HU-04 / TFS-012	Home con categorías destacadas	Conforme (27 pruebas)	5/5 Aprobadas (100%)	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada Conforme
HU-05 / TFS-013	Footer institucional y políticas	Conforme	6/8 Aprobadas	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada c/ Reparos
HU-06 / TFS-014	Sobre nosotros, dirección y horarios	Conforme	4/7 Aprobadas	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada c/ Reparos
HU-07 / TFS-015	Botón flotante de WhatsApp	Conforme	2/4 Aprobadas	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada c/ Reparos
HU-34 / TFS-053	Tienda en internet (Staging)	Conforme (360px)	4/4 Aprobadas (100%)	Rama: feature/plan-pruebas-sprint1 Commit: 26ff89d	Aceptada Conforme

4. DETALLE DE LOS 8 DEFECTOS TÉCNICOS (QA) Y CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN POR EL PO

Durante las pruebas oficiales registradas en el commit 26ff89d se documentaron los siguientes 8 defectos reales y verificables. El Product Owner tomó pleno conocimiento de cada uno de ellos durante la revisión y resolvió dar por aceptado el incremento, entendiendo que corresponden a textos/datos temporales de prueba y enlaces pendientes que se regularizarán en el Sprint 2:

- **CP-TFS-009-04 (HU-01):** La ficha del producto es explícitamente 'Producto ficticio para pruebas locales'; no parece el catálogo validado por César (requiere carga del inventario real).
- **CP-TFS-013-02 (HU-05):** /legal/terminos y /legal/privacidad dan 404. El footer (site-content.ts) apunta a /legal/terminos|privacidad|envios|devoluciones pero esas rutas no existen en el frontend.
- **CP-TFS-013-08 (HU-05):** sitemap.xml y robots.txt también dan 404: no hay nada configurado.
- **CP-TFS-014-01 (HU-06):** /contacto no tiene historia/descripción de la tienda.
- **CP-TFS-014-03 (HU-06):** No hay galería de fotos del local.
- **CP-TFS-014-05 (HU-06):** Correo de contacto aparece como 'Por confirmar'.
- **CP-TFS-015-02 (HU-07):** El botón de WhatsApp apunta a <https://wa.me/569000000000> — número placeholder, no confirmado (coincide con 'Número por confirmar' en /contacto).
- **CP-TFS-015-03 (HU-07):** Ese mismo link no lleva ?text= — no hay mensaje predefinido.

5. OBSERVACIONES Y REFINAMIENTO DE BACKLOG (FEEDBACK DEL CLIENTE)

- **OBS-01 (HU-14):** Calendario de torneos adaptable a días reales de eventos, no a días estáticos de la semana.
- **OBS-02 (HU-050):** Inventario enfocado exclusivamente en TCG, juegos de mesa y accesorios; comida excluida.
- **OBS-03 (HU-049):** QR y enlaces a comunidades de WhatsApp por juego visibles en el Home.
- **OBS-04 (Usabilidad):** Aumentar tamaño de tipografía en el menú de navegación superior para lectura cómoda.

6. DICTAMEN DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCT OWNER

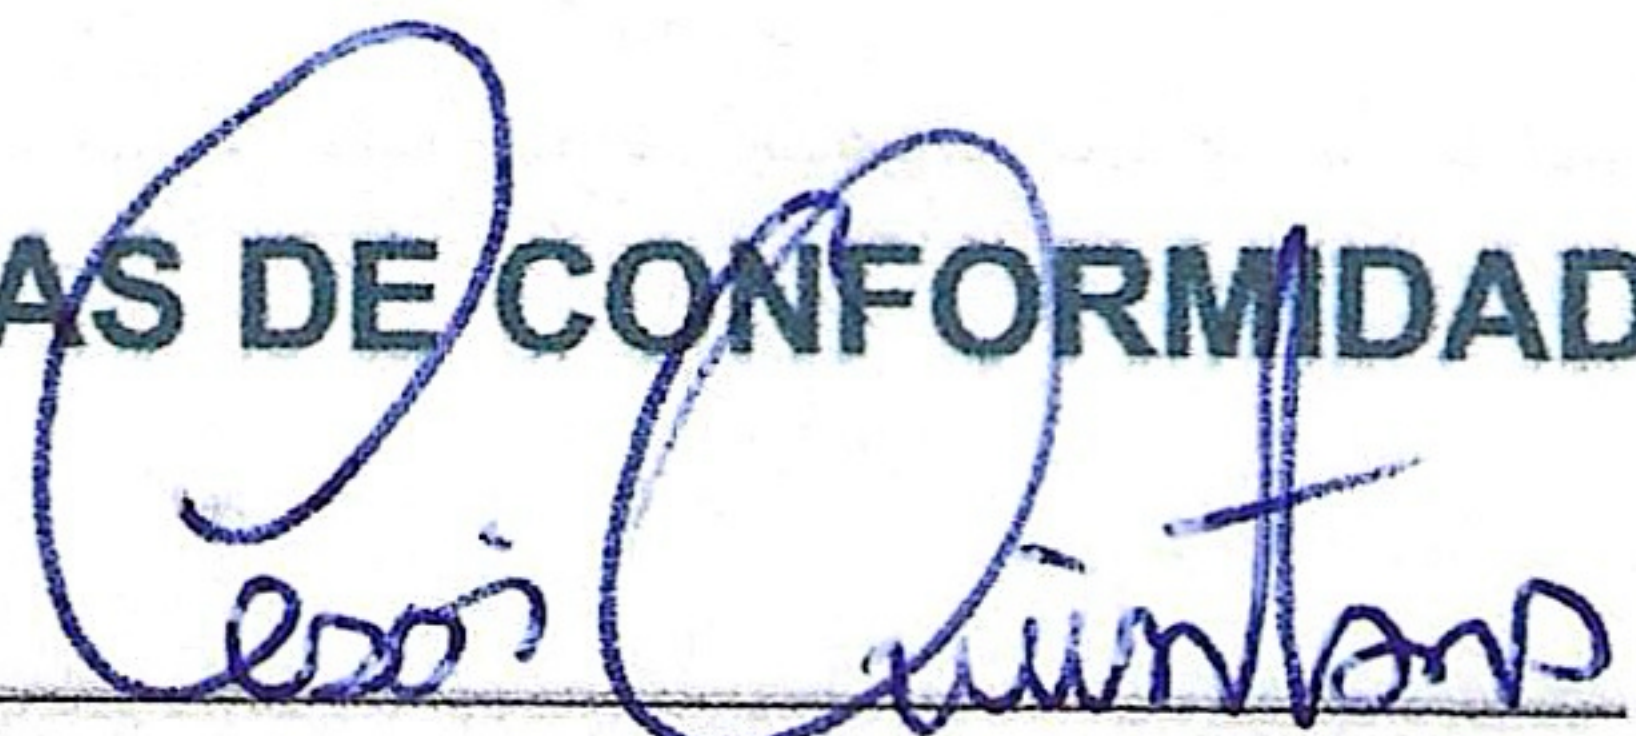
El Product Owner, don César Quintana Trujillo, habiendo visualizado y probado el software directamente en el navegador durante la demostración presencial (validando las 27 pruebas de interacción real de filtros, responsive 360px, productos agotados, más vendidos y edición admin) y conociendo el reporte de los 8 defectos menores de QA (Sección 4), declara formalmente:

☒ ACEPTADO CON REPAROS MENORES / OBSERVACIONES: Se da por recibido y formalmente aceptado el incremento funcional del Sprint 1, aprobando el despliegue en staging y autorizando el paso al Sprint 2 (Cuenta y Carrito). El cliente aprueba la entrega entendiendo que los defectos detectados son de contenido provisional y enlaces en construcción que serán subsanados en el ciclo entrante.

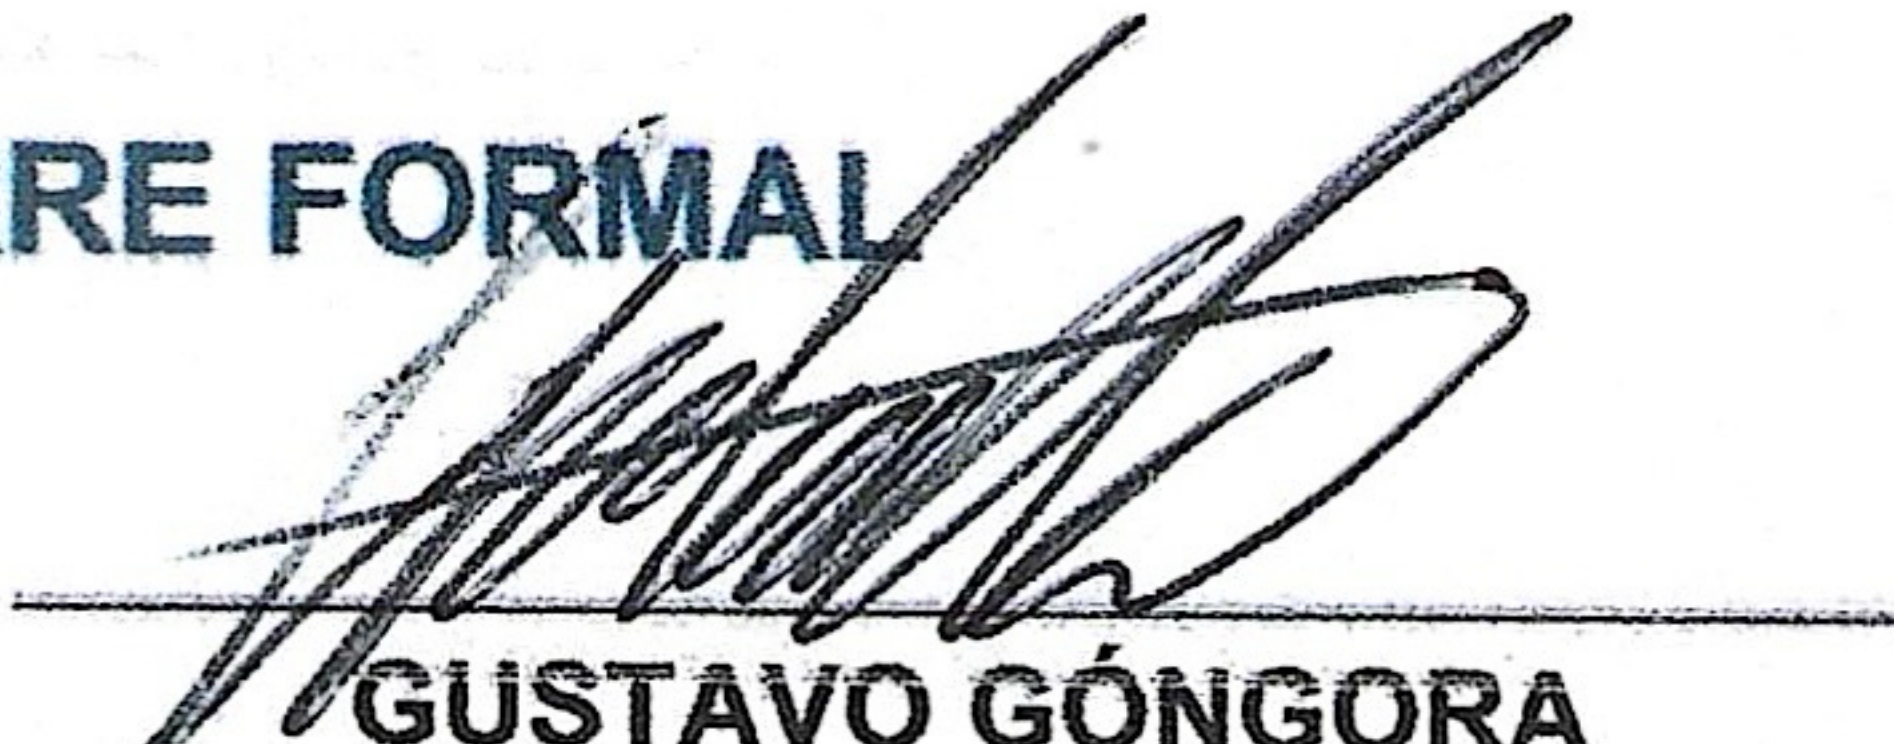
☐ ACEPTADO DEFINITIVO Y CONFORME TOTAL (Sin observaciones)

☐ RECHAZADO / NO ACEPTADO

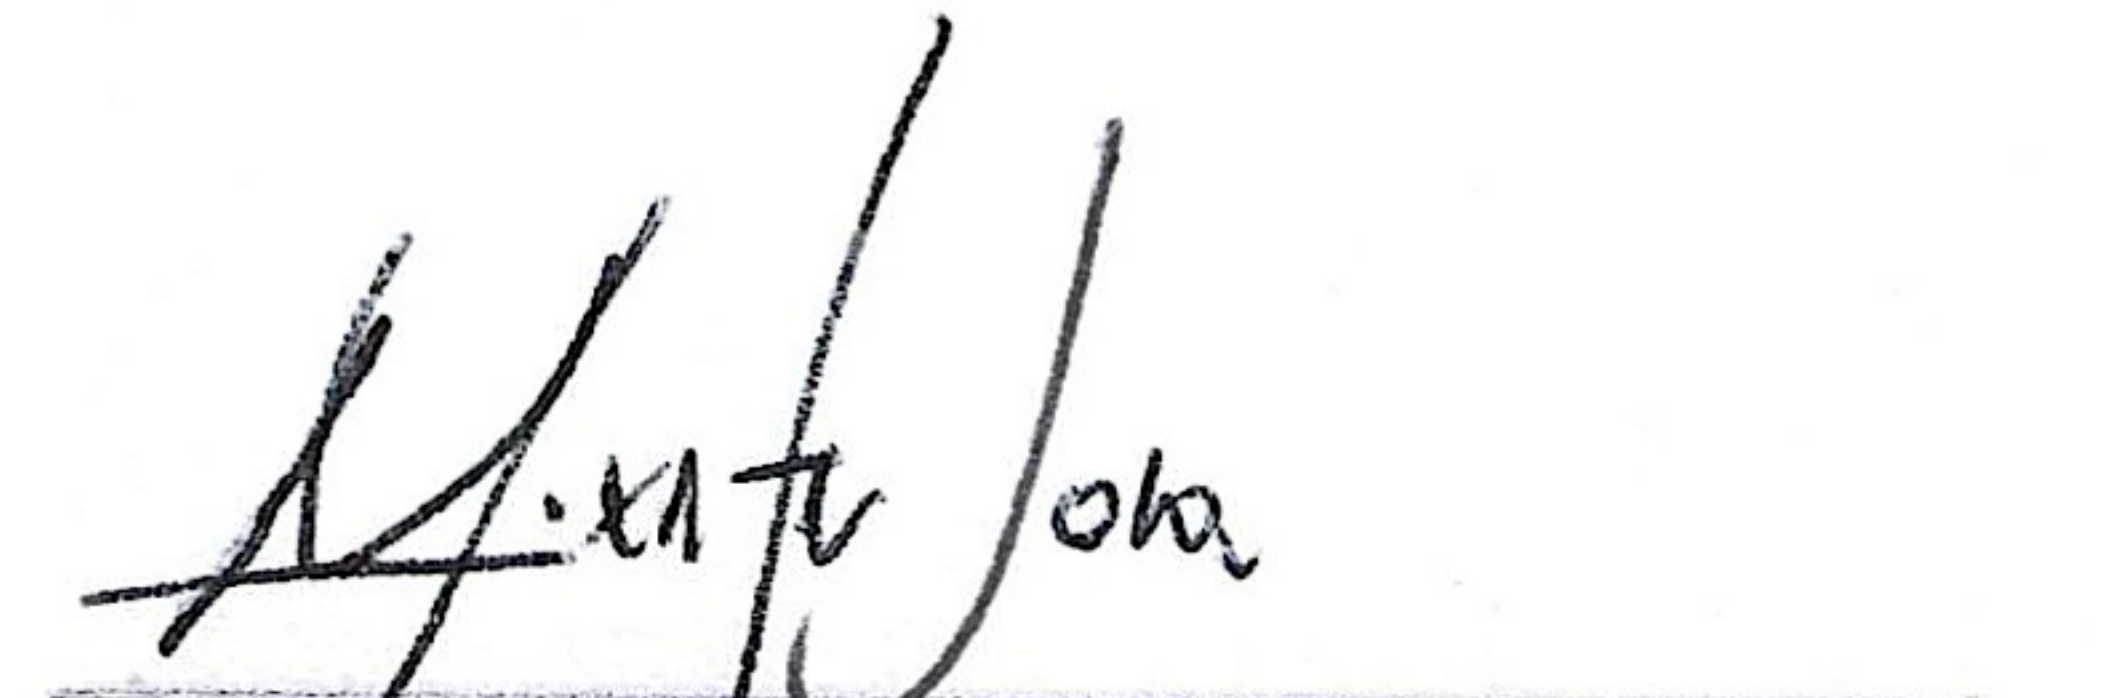
7. FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE FORMAL


CÉSAR QUINTANA TRUJILLO
Product Owner - Cliente
TodoFreak Store

Fecha: 27 / 09 / 2026


GUSTAVO GÓNGORA
Scrum Master
Equipo Proyecto APT

Fecha: 28 / 09 / 2026


MARTÍN JARA / MIGUEL ASTORGA
Developers (Equipo Técnico)
Equipo Proyecto APT

Fecha: 28 / 09 / 2026
